

TRAVAUX SUR RESEAU 2019

- LISTE DES TRAVAUX SUR RÉSEAU RÉALISÉS EN 2019
- PRÉSENTATION DE QUELQUES CHANTIERS

Secteur	Commune	Chantier	Linéaire		Matériau	Branche-ment renouvelé hors plomb	Branche-ment renouvelé en plomb	Objectif	Extension	Suppression	Montant AE HT
			Ø	m							
Sumellin/ Brie	Montigny les Condé	2019 ussa 01 Lot 2 RD 853 Rte de Pargny/ Fontenelle	Ø 100	526,2	fonte	3	0	Pose de canalisation et reprise de branchement			101 718,30
			Ø 60	54	fonte						
			total	580,2							
St Gengoulph /Epaux Bezu/la Ferte Milon	Monthiers	2019 usesa 01 Lot 3 Moulin de Brisé et Rue Leguiliez	Ø 100	15	fonte	5	8	Pose de canalisation et reprise de branchement			138 308,00
			Ø 60	850	fonte						
			total	865							
Château Thierry	Château Thierry	2019 usesa 01 lot 4 Rue du Paradis, Av Otmus, Rue de la mare aux canes	Ø 150	215	fonte	49	9	Renforcement de canalisation et reprise de branchement		Suppression d'une canalisation fonte Ø 80 = 455 ml Rue du Paradis	444 890,80
			Ø 200	205	fonte						
			Ø 100	80	fonte						
			Ø 80	90	fonte						
			Ø 60	30	fonte						
			total	620							
St Gengoulph /Epaux Bezu/la Ferte Milon	Montreuil aux Lions	2019 usesa 04 Lot 1 Av de Paris RD 1003 Rue de l'Eglise	Ø 150	600	fonte	36	32	Pose de canalisation et reprise de branchement		Suppression d'une canalisation fonte Ø 40 =130 ml Fort Henry	369 586,55
			Ø 100	10	fonte						
			Ø 80	430	fonte						
			Ø 60	200	fonte						
			Ø 63	20	PVC						
			total	1 260							
Sumellin/ Brie	Barzy sur Marne	2019 usesa 04 Lot 2 RD 320 Rues St Eloi, St Leu, Pasteur	Ø 150	2 450	fonte	114	7	Pose de canalisation et reprise de branchement		Suppression canalisation fonte Ø 60 = 270 ml	729 990,00
			Ø 125	10	fonte						
			Ø 100	50	fonte						
			Ø 80	10	fonte						
			Ø 60	110	fonte						
			Ø 63	10	PVC						
			total	2 640							

Secteur	Commune	Chantier	Linéaire		Matériau	Branche- ment renouvelé hors plomb	Branche- ment renouvelé en plomb	Objectif	Extension	Suppression	Montant AE HT
Fère en Tardenois/ Oulchy	Bruyères sur Fère	BC 21 Pont de l'Ourcq Hameau de Trugny	Ø 200	14	fonte			Renouvellement de canalisation calorifugée en encorbellement			18 651,50
			Ø 90	26	PEHD						
			Ø 63	7	PVC						
			total	47							
Essomes/ Nogent	Nogent L'Artaud	BC 23 Route de Rebais Chemin de l'hermitage	Ø 80	1	fonte			Devoiemment de réseau et raccordement			9 039,00
			Ø 125	37	fonte						
			total	38							
Sumellin/ Brie	Mézy Moulins	BC 24 Rue de la Galerie	Ø 100	144	fonte	3	4	Renouvellement de canalisation et de branchement			38 013,50
			Ø 200	6	fonte						
			total	150							
Essomes/ Nogent	Essomes sur Marne	BC 25 Thiolet / Bourbetin	Ø 100	1,5	fonte	2	0	Pose de canalisation et renouvellement de branchement	Suppression = 1 300 ml		9 459,15
Château Thierry	Château Thierry	BC 26 Rue Courteau					3	Suppression de conduite et renouvellement de branchement en plomb	fonte Ø 40 = 20 ml		6 850,00
St Gengoulph /Epaux Bezu/la Ferte Milon	Etrepilly	BC 28 Chemin de Saint Robert	Ø 60		fonte			Pose de canalisation	Extension de 132 ml		11 850,00
Château Thierry	Château Thierry	BC 29 et 30 Rue des Granges	Ø 100	5	fonte	13		Renouvellement de canalisation et de branchement			26 897,06
			Ø 150	114	fonte						
			Ø 200	7	fonte						
			total	126							

Secteur	Commune	Chantier	Linéaire		Matériau	Branche-ment renouvelé hors plomb	Branche-ment renouvelé en plomb	Objectif	Extension	Suppression	Montant AE HT
			Ø	m							
Surmeulin/ Brie	Courtemont Varennnes Reuilly Sauvigny	2018 usesa 10 RD 1003 entre Courtemont Varennnes et Reuilly Sauvigny	Ø 200	4247	fonte	66	18	Renouvellement de canalisation et de branchement			885 264,00
			Ø 125	385	fonte						
			Ø 100	10	fonte						
			Ø 80	351	fonte						
			total	4993							
Château Thierry	Château Thierry	Rue du Château	Ø 150	371	fonte	37	20	Renouvellement de canalisation et de branchement			236 210,66
Château Thierry	Château Thierry	2018 usesa 26 Rue Carnot Place du Maréchal Leclerc	Ø 350	110	fonte	28	1	Renouvellement de canalisation et de branchement	extension de 12 ml	Suppression fonte Ø 80 =125 ml	267 759,50
			Ø 150	65	fonte						
			Ø 75	40	PVC						
			total	215							
TOTAL ML POUR 2019 :			11 906,45	TOTAL BRT :	356	102	TOTAL HT :	144,00	2 300,00	3 294 488,02	
TOTAL ML SUPPRESSION 2019:			2 300,00		458						
dont TOTAL ML EXTENSION 2019 :			144,00								
			Extension & suppression 2019								
	Total cumulé	Total suppression	Total Extension			Total cumulé 2019					
	1 230,60 km²	2 300 mètres	144 mètres			1 228,44 km					
* La longueur de réseau de l'USESA a été mise à jour sur la base du SIG et l'intégration de la commune de Charly sur Marne.											
Linéaire total Charly sur Marne = 30,156 kms											
Dont 10,152 kms déjà comptabilisés (alimentation des fermes de Domptin)											
et l'ajout de 20,04 kms depuis le 01/01/2019 (adhésion de la commune à l'USESA)											

TRAVAUX SUR RESEAU 2019

PRÉSENTATION DE QUELQUES CHANTIERS



Montigny les Condé

- ▶ **Lieu** : RD 853 Route de Pargny et Hameau de Fontenelle
- ▶ **Entreprise titulaire** : TPA
- ▶ **Objectifs** : Renouveler une canalisation en mauvais état et en domaine privé
- ▶ **Montant du marché** : 101 718,30 € HT

Travaux réalisés

Canalisations renouvelées:

- 526 ml en DN 100 Fonte
- 54 ml en DN 60 Fonte

3 branchements renouvelés



Monthiers

- ▶ **Lieu** : Rue Leguillez et Moulin de Brisé
- ▶ **Entreprise titulaire** : TPA
- ▶ **Objectifs**: Renouveler une canalisation en mauvais état - 5 fuites sur 3 ans
- ▶ **Montant du marché** : 138 308,00 € HT

Travaux réalisés

Pose de 850 ml de canalisation en DN 60 Fonte

13 branchements renouvelés



Château-Thierry

- ▶ **Lieu** : Avenue Otmus et Rue du Paradis
- ▶ **Entreprise titulaire** : EUROVIA
- ▶ **Objectifs** : Renouveler une canalisation en mauvais état qui entraine des coupures d'eau pour de nombreux abonnés – opération liée au projet ANRU de la Ville – 8 fuites sur 4 ans
- ▶ **Montant du marché** : 444 890,80 € HT

Travaux réalisés

Renouvellement de

- 205 ml en DN 200
- 405 ml en DN 150 et <

58 branchements renouvelés



Château-Thierry

- ▶ **Lieu** : Place Maréchal Leclerc et Rue Carnot
- ▶ **Entreprise titulaire** : RVM
- ▶ **Objectifs** : Supprimer la bi-canalisation de la rue et renouveler une canalisation en mauvais état en amont des futurs travaux d'aménagement de la place.
- ▶ 5 fuites en 3 ans
- ▶ **Montant du marché** : 267 759,50 € HT

Travaux réalisés

Canalisations renouvelées:

- 110 ml en DN 350 Fonte
- 65 ml en DN 150 Fonte
- 40 ml en DN 75 PVC

29 branchements renouvelés



Courtemont-Varennnes / Reuilly-Sauvigny


- ▶ Lieu : RD 1003 de Courtemont-Varennnes à Sauvigny
- ▶ Entreprise titulaire : RVM
- ▶ Objectifs : Renouveler une canalisation en mauvais état et en domaine privé
- ▶ Montant du marché : 885 364,00 € HT – subventionné à 50% dans le cadre du plan d'actions de réductions des fuites de l'AESN

Travaux réalisés

4 247 ml de réseau à renouveler en DN 200

385 ml de réseau à renouveler en DN 125
361 ml de réseau en DN 100 et <

84 branchements renouvelés

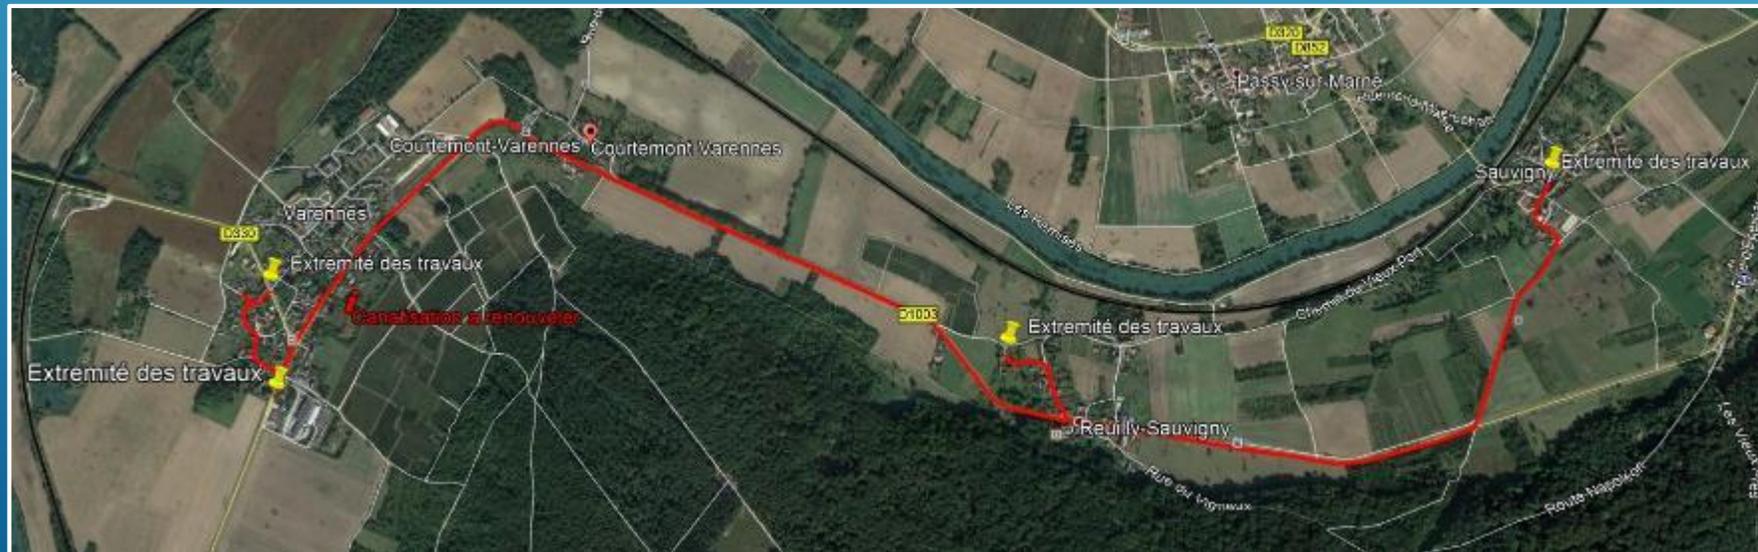

Courtemont-Varennes / Reuilly-Sauvigny




BARZY SUR MARNE

- ▶ **Lieu** : Rue Saint-Eloi et Rue Saint-Leu – RD 320
- ▶ **Entreprise titulaire** : TPA
- ▶ **Objectif** : Renouveler une canalisation en mauvais état - 6 fuites sur 3 ans
- ▶ **Montant des travaux** : 729 990,00 € HT

Travaux réalisés

2 450 ml de canalisation renouvelés en DN 150 Fonte
121 branchements renouvelés

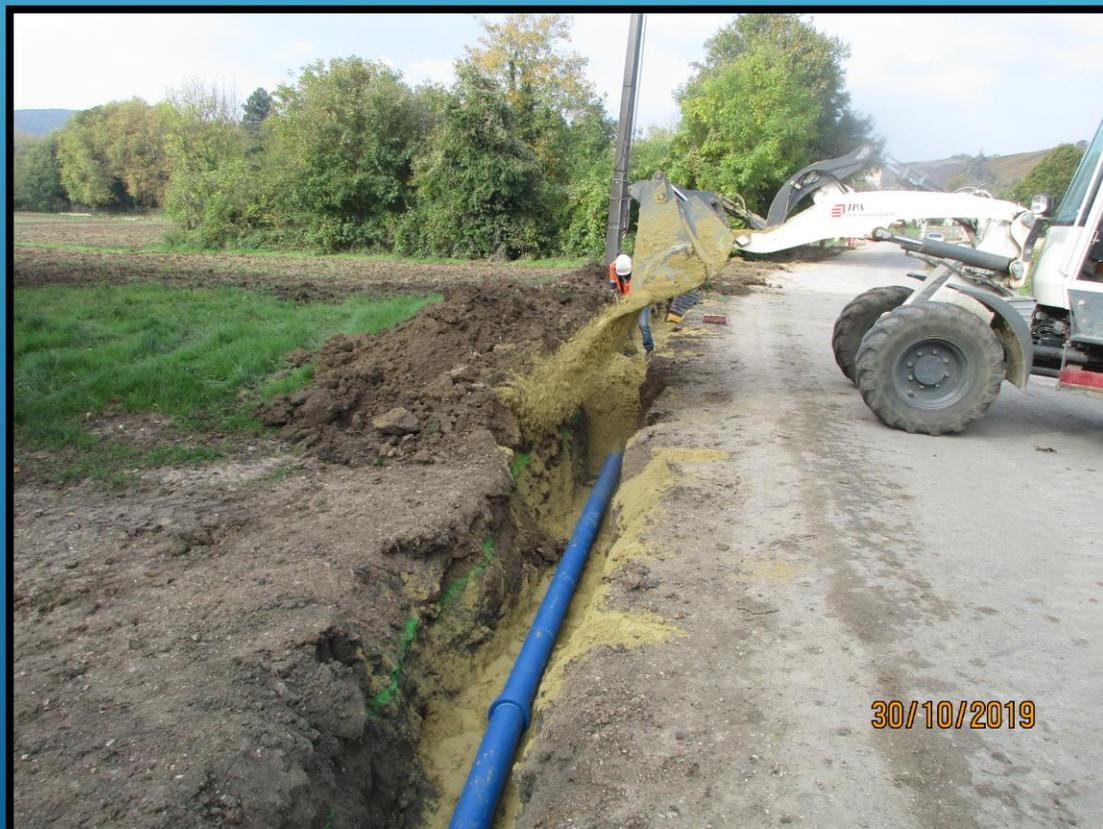

MONTREUIL AUX LIONS

- ▶ **Lieu** : Avenue de Paris RD 1003 – rue de l'Eglise
- ▶ **Entreprise titulaire** : TPA
- ▶ **Objectif** : Renouveler deux canalisations en mauvais état préalablement aux travaux de voirie de la commune - 5 fuites sur 3 ans
- ▶ **Montant des travaux** : 369 586,55 € HT

Travaux réalisés

Canalisations renouvelées :

- 600 ml en DN 150 Fonte
- 630 ml en DN 80 et 60 Fonte

34 branchements renouvelés



Château-Thierry

- ▶ Lieu : Rue du Château
- ▶ Entreprise : RVM
- ▶ Objectifs : Renouveler une canalisation en mauvais état et travaux communaux
- ▶ Montant du marché : 236 210,66 € HT
- ▶ Durée des travaux : 13,5 mois

Travaux réalisés

Canalisations renouvelées :

- 371 ml en DN 150 Fonte

57 branchements renouvelés

