

# TRAVAUX SUR RESEAUX 2020

- Liste des travaux sur réseau réalisés en 2020
- Présentation de quelques chantiers en images



SECTEURS	Communes	Chantiers	Linéaire		Matière	Branchement renouvelé		Objectif	Extension	Suppression	Coût HT	
						hors plomb	en plomb					
SURMELIN BRIE	Barzy-sur-Marne	Place Dom Perignon Rue des Terres Cheval	ø 60 ø 80 <b>Total</b>	45 65 <b>110</b>	Fonte Fonte	9	3	Renouvellement canalisations et branchements			39 321,26	
	Dhuys et Morin en Brie	Route de Nesles Artonges	ø 150 ø 125 ø 60 ø 200 <b>Total</b>	2 350 300 240 305 <b>3 195</b>	Fonte Fonte Fonte PVC				4			
CHÂTEAU-THIERRY	Etampes-sur-Marne	Avenue de Montmirail RDI/RD1003 Avenue E. Couvrecelle Rue Nervo	ø 300 ø 250 ø 150 ø 100 ø 80 <b>Total</b>	1 050 60 40 20 30 <b>1 200</b>	Fonte Fonte PVC Fonte Fonte	48	12	Renouvellement canalisations et branchements				
	Château-Thierry	Rue Jean de la Fontaine	ø 150 ø 100 ø 63 <b>Total</b>	305 19 7 <b>331</b>	Fonte Fonte PVC				13	4		
	Nesles-la-Montagne	Nesles Nouveau	ø 125 ø 60 <b>Total</b>	350 370 <b>720</b>	Fonte Fonte	6	28					
	Gland	Rue du Carrefour	ø 60	40	Fonte						Raccordement et pose de réseau	
	Etampes-sur-Marne	Rue de la Prairie	ø 60		Fonte			Extension canalisation	83 ml		13 478,50	
	ST GENGOULPH EPAUX BÉZU LA FERTÉ MILON	Montreuil-aux-Lions	RD 1003 Avenue de Paris	ø 150 ø 30 <b>Total</b>	600 320 <b>920</b>	Fonte Fonte	14	20	Renouvellement canalisations et branchements			245 647,50
Bézu-Saint-Germain		Rue Barbette	ø 160	173	PVC	14						
Dammard		Rue du Jeu d'Arc, Hameau de Montemafroy	ø 80	70	Fonte	3		Renouvellement canalisations et branchements			20 489,62	
La Ferté-Milon		Parvis du château	ø 60	53	Fonte		3					
Saint Gengoulph		De Chevillon à Monnes	ø 150 ø 100 ø 60 <b>Total</b>	2 300 10 80 <b>2 390</b>	Fonte Fonte Fonte							
Travaux d'interconnexion entre Château-Thierry et Villers-Cotterêts		Lot 1 Lauconnois/Torcy	ø 350 ø 200 <b>Total</b>	190 190 <b>380</b>	Fonte Fonte							
			ø 200 ø 150 <b>Total</b>	3 275 990 <b>4 265</b>	Fonte Fonte							
		Lot 3 La Ferté-Milon/Villers-Cotterêts/Marolles	ø 200 ø 100 <b>Total</b>	340 <b>340</b>								2
ESSÔMES SUR MARNE	Chézy-sur-Marne	Chemin de la Croix Bodart	ø 125	51	Fonte	1		Renforcement canalisation			13 355,75	
NOGENT L'ARTAUD	Essômes-sur-Marne	Chemin des 5 Clos Hameau de Monneaux	ø 150		Fonte	1		Extension canalisation			28 173,75	
FÈRE EN TARDENOIS	Oulchy-le-Château	D473 Hameau Les Crouttes	ø 63 <b>Total</b>	108 <b>108</b>	PVC	1		Renouvellement canalisations			8 565,50	
OULCHY LE CHATEAU	Seringes-et-Nesles	Rue du Paradis Hameau de Nesles en Dôle	ø 100 ø 60 <b>Total</b>	27 102 <b>129</b>	Fonte Fonte						9	

<b>TOTAL ML POUR 2020</b>	14 475,00	<b>TOTAL BRT</b>	123	72	<b>TOTAL HT</b>	6 223,00	340,00	4 055 876,08
<b>TOTAL ML SUPPRESSION 2020</b>	340,00		195					

# TRAVAUX SUR RESEAUX 2020

Quelques chantiers en images



# DHUYS ET MORIN EN BRIE (Artonges)

- ▶ **Lieu** : RD 866 Route de Nesles entre le réservoir et La Ville aux Bois
- ▶ **Entreprise titulaire** : TPA
- ▶ **Objectif** : Renouveler une canalisation en mauvais état et en domaine privé - 4 fuites sur 3 ans
- ▶ **Montant des travaux** : 287 865,10 € HT

## Travaux réalisés

Canalisations renouvelées:

- 2 350 ml en DN 150 Fonte
- 300 ml en DN 125 Fonte
- 240 ml en DN 60 Fonte

4 branchements renouvelés



# NESLES LA MONTAGNE

- ▶ **Lieu** : Nesles Nouveau RD 1
- ▶ **Entreprise titulaire** : EUROVIA Picardie
- ▶ **Objectif** : Renouveler deux canalisations en mauvais état préalablement aux travaux communaux
- ▶ **Montant des travaux** : 267 522,90 € HT

## Travaux réalisés

Canalisations renouvelées:

- 350 ml en DN 125 Fonte
- 370 ml en DN 60 Fonte

34 branchements renouvelés



# CHÂTEAU-THIERRY

- ▶ **Lieu** : Rue Jean de la Fontaine
- ▶ **Entreprise titulaire** : RVM
- ▶ **Objectif** : Renouveler une canalisation ancienne préalablement aux travaux de réhabilitation d'une rue historique de Château-Thierry
- ▶ **Montant des travaux** : 216 343,50 € HT

## Travaux réalisés

305 ml de canalisation renouvelés en DN 150 Fonte

17 branchements renouvelés



# ETAMPES SUR MARNE

- ▶ **Lieu** : Avenue de Montmirail RD 1 / RD 1003 et Avenue Ernest Couvrecelle / Rue Nervo
- ▶ **Entreprise titulaire** : TPA
- ▶ **Objectif** : Renforcer une canalisation pour améliorer la distribution de l'eau sur Château-Thierry préalablement aux travaux du giratoire.
- ▶ **Montant des travaux** : 753 505,00 € HT

Travaux réalisés	
Renouvellement de 1050 ml de canalisation en DN 300 Fonte	110 ml de canalisation à renouveler en DN 250 Fonte et <
60 branchements renouvelés	




# Saint-Gengoulph / Monnes

- ▶ **Lieu** : de Chevillon à Monnes
- ▶ **Entreprise titulaire** : RVM
- ▶ **Objectif** : Renouveler une canalisation en mauvais état – Redimensionnement du réseau en lien avec l'interconnexion Château-Thierry / La Ferté-Milon
- ▶ **Montant du marché** : 214 699,40 €.HT
- ▶ **Délai des travaux** : 2 mois

## Travaux à réaliser

2 300 ml de canalisation à renouveler en DN 150 Fonte

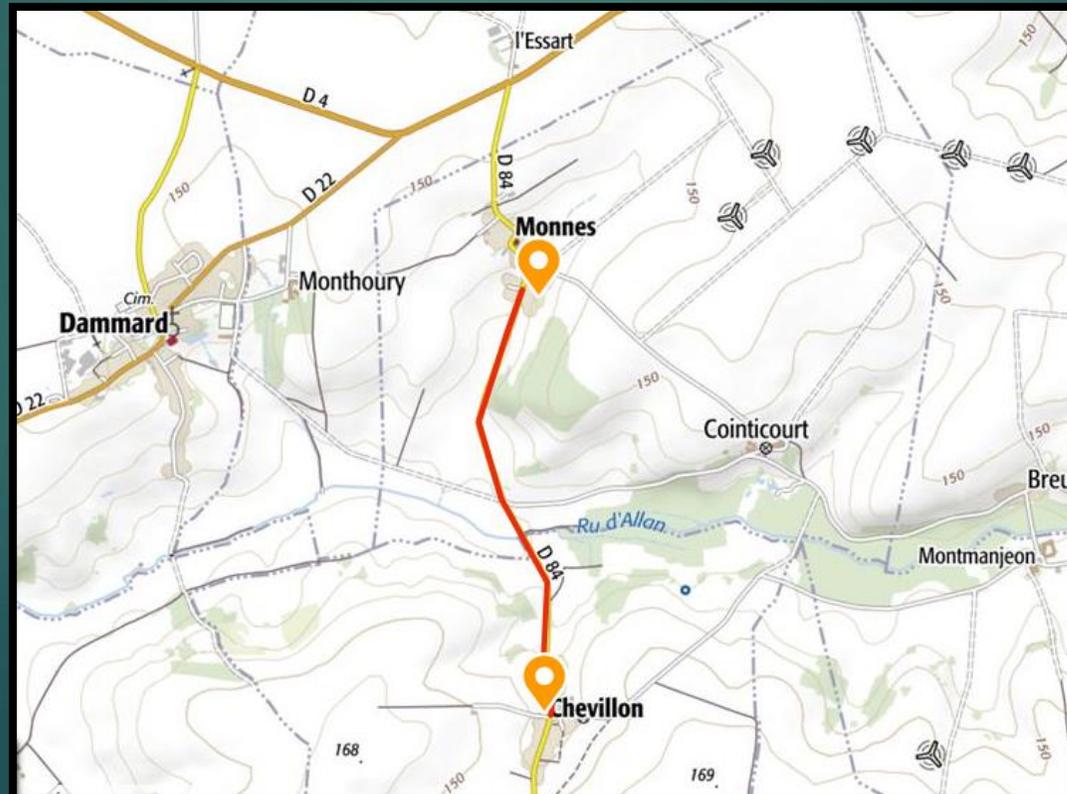

# MONTREUIL AUX LIONS

- ▶ **Lieu** : Avenue de Paris RD 1003
- ▶ **Entreprise titulaire** : TPA
- ▶ **Objectif** : Renouveler deux canalisations en mauvais état préalablement aux travaux de voirie de la commune - 5 fuites sur 3 ans
- ▶ **Montant des travaux** : 245 647,50€ HT

## Travaux réalisés

Canalisations renouvelées :

- 600 ml en DN 150 Fonte
- 320 ml en DN 80 Fonte

34 branchements renouvelés



# Interconnexion Château-Thierry / Villers-Cotterêts

- ▶ **Lot 1** : Entre le réservoir de Lauconnois et l'UTEP de Torcy en Valois
- ▶ **Objectif** : Secourir l'UDI de Saint-Gengoulph
- ▶ **Maître d'œuvre** : CEREG Pays de Champagne
- ▶ **Entreprise titulaire** : TPA
- ▶ **Montant des travaux** : 573 725,00 € HT en 2020
- ▶ **Délai des travaux** : 24 semaines

## Travaux réalisés

Pose de 190 ml de canalisation en DN 350 Fonte

Pose de 190 ml de canalisation en DN 200 Fonte



# Interconnexion Château-Thierry / Villers-Cotterêts

- ▶ **Lot 2 :** Entre Monnes et La Ferté-Milon
- ▶ **Objectif :** Secourir l'UDI de La Ferté-Milon
- ▶ **Maître d'œuvre :** CEREG Pays de Champagne
- ▶ **Entreprise titulaire :** TPA
- ▶ **Montant des travaux :** 459 593,00 € HT en 2020
- ▶ **Délai des travaux :** 32 semaines

## Travaux réalisés

Pose de 3 275 ml de canalisation en DN 200 Fonte

Pose de 990 ml de canalisation en DN 150 Fonte



# INTERCONNEXION CHÂTEAU-THIERRY – VILLERS-COTTERETS

- ▶ **Lieu** : LOT 3 LA FERTE-MILON - VILLERS-COTTERETS – MAROLLES
- ▶ **Maître d'œuvre** : CEREG Pays de Champagne
- ▶ **Entreprise titulaire** : TPA
- ▶ **Objectif** : Secourir l'UDI de MAROLLES et VILLERS-COTTERETS
- ▶ **Montant des travaux** : 802 067,40 € HT
- ▶ **Délai des travaux** : 20 semaines



## Travaux réalisés

Pose de 5 390 ml de canalisation en DN 200 Fonte

Pose de 940 ml de canalisation en DN 100 Fonte

2 branchements renouvelés

